Trøndelag fylkeskommune
Tröndelagen fylhkentjïelte

Sluttoppgjør Frøyatunnelen og rutiner for utbetaling av krav

Kontrollutvalget 17.11.2026

Historikk -1

- Rehabiliteringsarbeider Fv 714 Frøyatunnelen – **kontrakt mellom TRFK og Kraftmontasje**
- **Kontraktssum** 470,5 mill kr, signert 16.03.2023
- TRFK er byggherre
- Kraftmontasje har vært hovedentreprenør – TRFK's kontraktspart
- **Allgrunn** har vært Kraftmontasjes underentreprenør
- Gjennom hele anleggsperioden – **utbetaling i hht kontraktsregler**
- Holder tilbake 10 % av hver A-nota faktura (innestående) inntil 5 % av kontraktssummen

Historikk -2

- 23.06.2025 – TRFK **mottar sluttoppgjørsoppstilling** fra Kraftmontasje
- 11.07.2025 – TRFK leverer **byggherrens tilbakemelding** på sluttoppgjøret
- 22.08.2025 – Ved en **inkurie utbetalte TRFK *hele* sluttfakturaen** til Kraftmontasje, framfor kun det aksepterte sluttbeløpet.
- 26.08.2025 - Feilutbetalingen ble **varslet til Kraftmontasje med krav om tilbakebetaling**
- 05.09.2025 – Kraftmontasje **tilbakebetalte** et mindre beløp etter innsigelser i sluttoppgjøret

Historikk -3

- Etter 22.08.2025 – **flere interne avklaringer** med Økonomi og Juridisk
- **Engasjerer adv firmaet Simonsen Vogt Wiig** til å føre saken for TRFK
- TRFK **sender krav** om tilbakebetaling, Kraftmontasje **avviser alle krav** om tilbakebetaling
- 19.12.2025 – **Prosessvarsel sendt** fra TRFK til KM
- 09.01.2026 – **TRFK tar ut stevning** mot KM
- 15.-17.09.2026 – **Rettsmekling TRFK – KM**
- 19.-30.10.2026 – **Hovedforhandling (rettssak)**

Tvistesaken

- **Manglende tilbakebetaling** av feilutbetalt beløp


- Kontrakten – sluttoppgjøret, **uenighet om mengdene** i sluttoppgjøret (omfang og forståelse)

Parallell sak

- **Sak mellom** Kraftmontasje og Allgrunn (underentreprenør)
- 30.10.2025 – Allgrunn tar ut stevning mot Kraftmontasje
  - Svært mange av **de samme tvistesakene** som mellom TRFK og Kraftmontasje
- 20.08.2026 – **Forlik** mellom Kraftmontasje og Allgrunn

Rettsmekling – Tvist Frøytunnelen

- 15.-17.09.2026 – **Rettsmekling TRFK – Kraftmonntasje**
- Det ble meklet om **omtvistet beløp** i sluttoppgjøret
- 3 dager - begge partene la fram sitt utgangspunkt - mekling
- **Rettsforlik** – Kraftmontasje betaler kr 21,5 mill kr til TRFK innen 01.10.2026. Summen er inkl. mva og inkl renter.
- Saken **er avsluttet**, ingen rettssak.

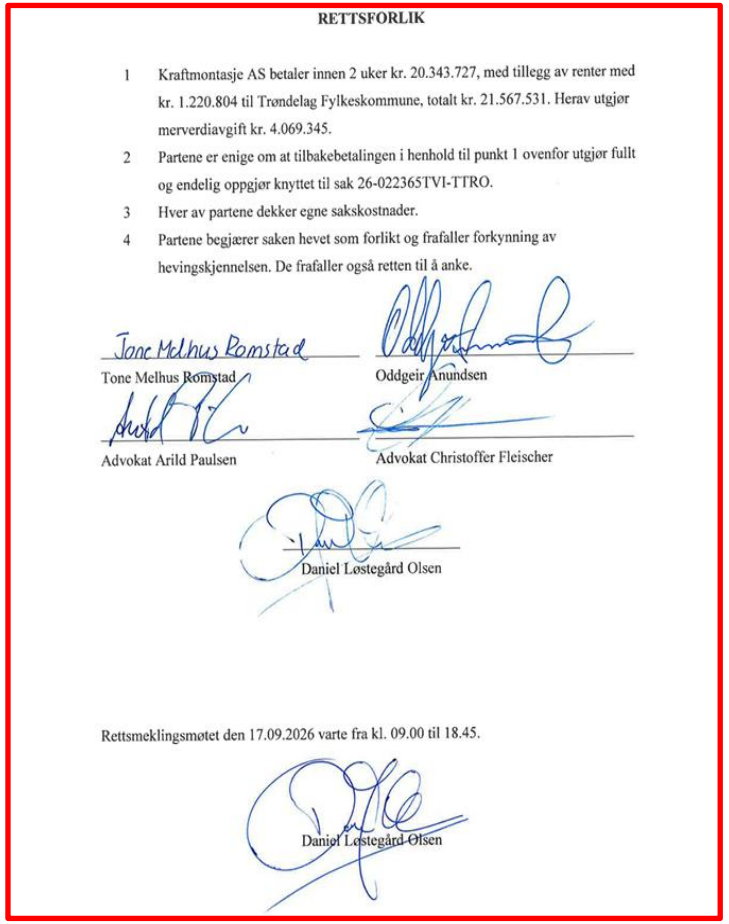

RETTSFORLIK

1 Kraftmontasje AS betaler innen 2 uker kr. 20.343.727, med tillegg av renter med kr. 1.220.804 til Trøndelag Fylkeskommune, totalt kr. 21.567.531. Herav utgjør merverdiavgift kr. 4.069.345.

2 Partene er enige om at tilbakebetalingen i henhold til punkt 1 ovenfor utgjør fullt og endelig oppgjør knyttet til sak 26-022365TVI-TTRO.

3 Hver av partene dekker egne sakskostnader.

4 Partene begjærer saken hevet som forlikt og frafaller forkynning av hevingskjennelsen. De frafaller også retten til å anke.

Tone Melhus Romstad — Oddgeir Anundsen

Advokat Arild Paulsen — Advokat Christoffer Fleischer

Daniel Løstegård Olsen

Rettsmeklingsmøtet den 17.09.2026 varte fra kl. 09.00 til 18.45.

Daniel Løstegård Olsen

Feilutbetaling i sluttoppgjør – kort om hendelsen og videre oppfølging i økonomiavdelingen

Sluttfakturaen ble utbetalt på feil grunnlag som følge av en svikt i den interne saksbehandlingen


- Veiavdelingen ga regnskapsseksjonen beskjed **om at kun deler av fakturaen** skulle utbetales
- Da den parkerte fakturaen senere ble frigitt av regnskapsseksjonen, ble ved en inkurie **hele fakturabeløpet** sendt til utbetaling.
- Feilen ble **oppdaget først etter** at utbetalingen var gjennomført.
- Fylkeskommunens bank **ble umiddelbart kontaktet** for å forsøke å stanse transaksjonen, men på dette tidspunktet **var utbetalingen allerede gjennomført**.

Hvordan unngå at slike hendelser inntreffer i framtiden?

- **Det nye regnskapssystemet** håndteres omtvistede fakturaer på en ny måte
- **Fakturabehandler (anviser) registrerer selv** det beløpet som er omtvistet direkte i systemet
- **Beløpet som skal holdes tilbake, låses** dermed allerede ved anvisning/godkjenning av fakturaen
- Denne funksjonaliteten var **ikke tilgjengelig** i det tidligere regnskapssystemet
- Dette **reduserer risikoen** for tilsvarende feilutbetalinger

Beløp som ikke lenger er omtvistet, og skal utbetales

- Anviser sender e-post til regnskap med informasjon om beløpet som skal løses opp og utbetales
- Endring av omtvistet beløp registreres av regnskap
- Det skal foretas ekstra kontroll for beløp over kr 100 000 (to par øyne)
- Beløpet til utbetaling kommer med på neste forslag til remittering. Remiteringsforslaget kontrolleres og godkjennes av regnskap, før overføring til bank for utbetaling.



Trøndelag
fylkeskommune

Tröndelagen fylhkentjïelte

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
